


ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561

Type of Document	Total (Estimate)	Submitted	Approved
Material Submission	500	74	3
Method Statement	100	32	11
Shop Drawing	5000	771	151
Total	5600	877	165

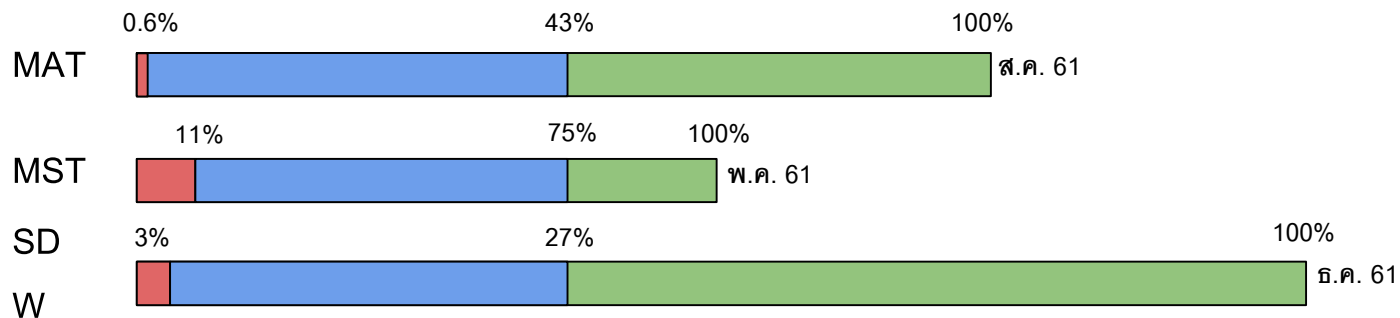

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561


รายการเอกสารที่ต้องส่ง	กำหนดส่ง ภายใน วันที่	สถานะ	PCS	SCS	AOT
ประกันภัยของโครงการ	13 ต.ค. 60	ตามกำหนด	22 มี.ค. 61 (แก้ไขครั้งที่ 5)	4 เม.ย. 61	อยู่ระหว่างพิจารณา
แผนงานก่อสร้าง	7 เม.ย. 61	ตามกำหนด	2 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างพิจารณา	
แผนงานการส่งเอกสาร	3 ต.ค. 60	ล่าช้า 115 วัน	25 ม.ค. 61	7 มี.ค. 61 (แก้ไขและส่งใหม่)	-
แผนผังองค์กร	23 ก.ย. 60	ล่าช้า 83 วัน	8 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างพิจารณา

ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561

Material Stock Yard




แนวกำแพงคอนกรีตบล็อกที่ CC1/2 ดำเนินการ

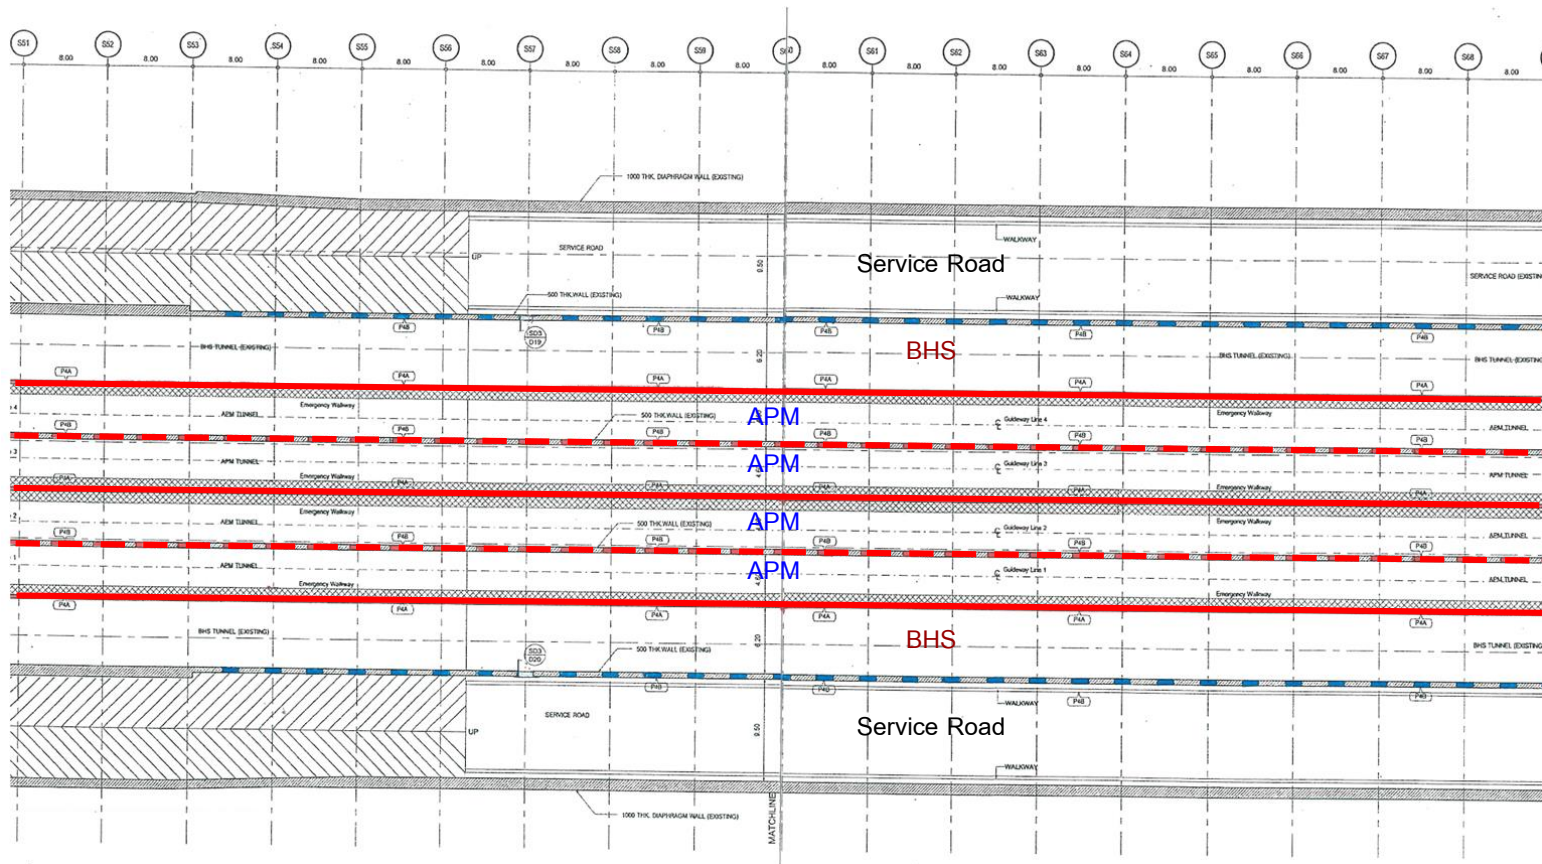

- Line 1 (GL.49E)
- Line 2 (GL.50E)
- Line 3 (Center)
- Line 4 (GL.50W)
- Line 5 (GL.49W)

ความก้าวหน้ารวมงานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102

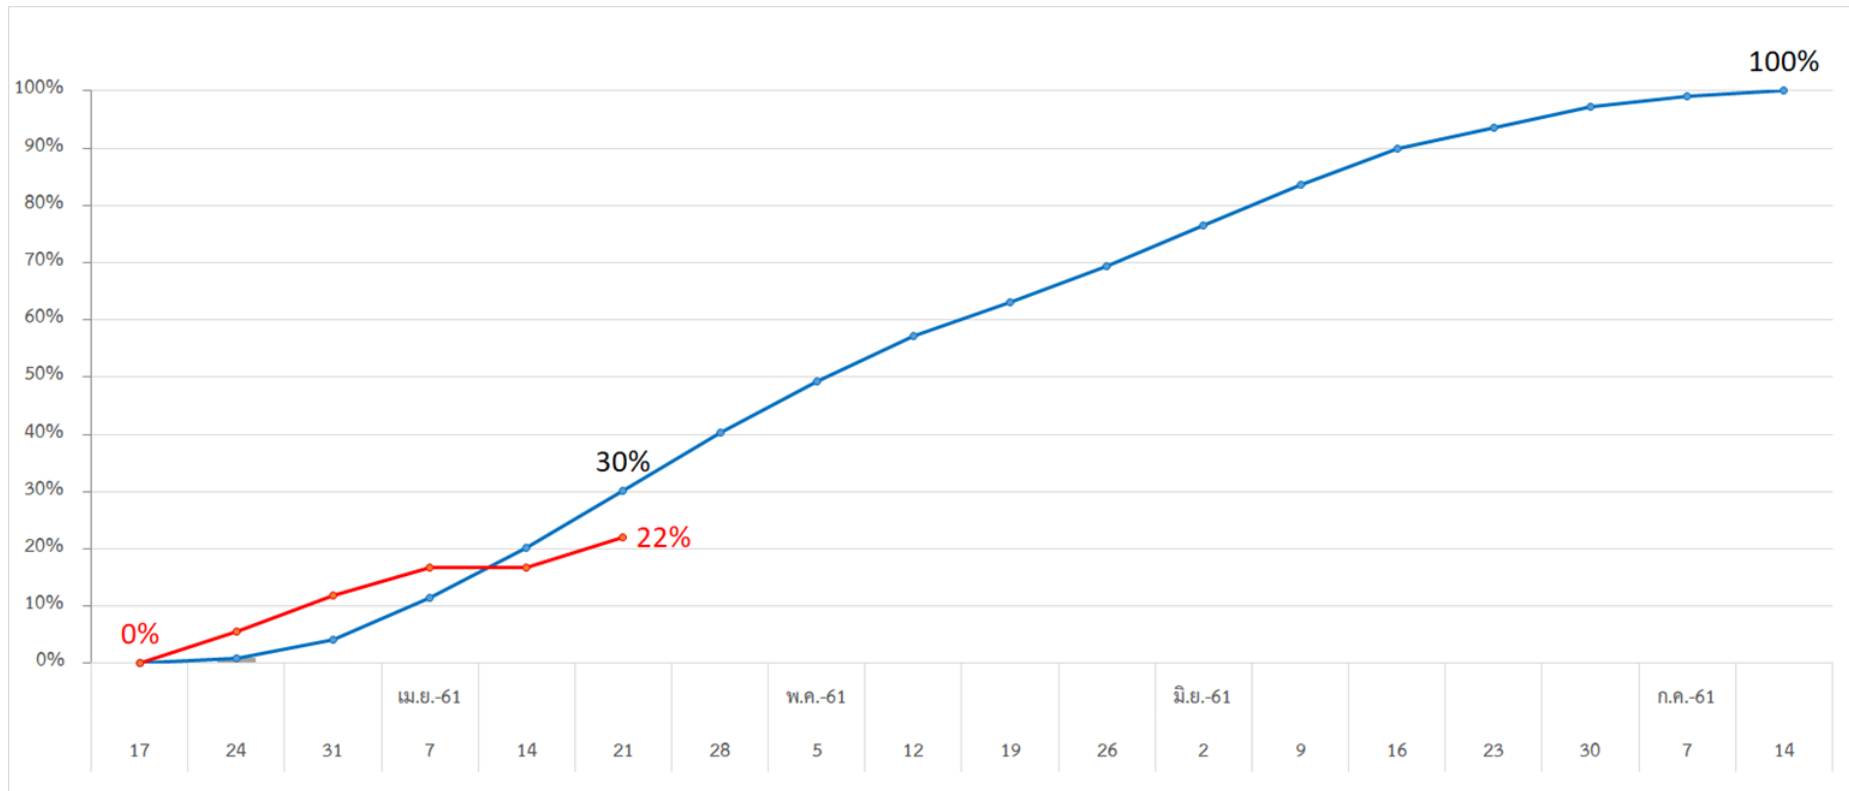


Planned

Actual


Actual

ความก้าวหน้างานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102


Line 1 (GL.49E)

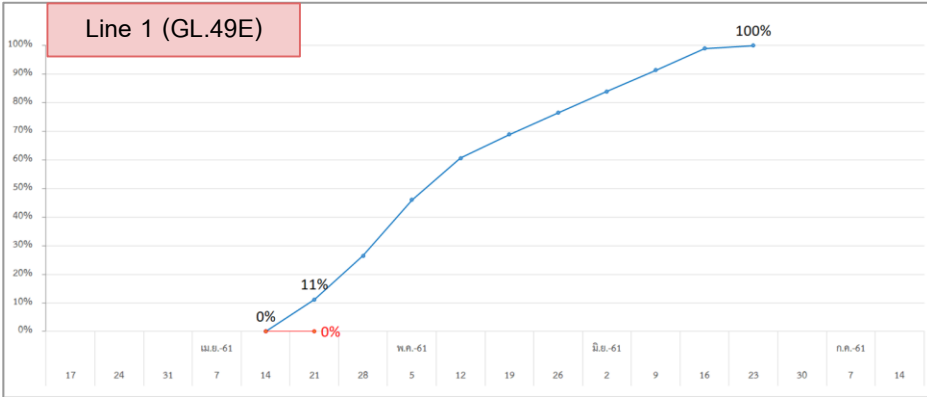

Line 2 (GL.50E)

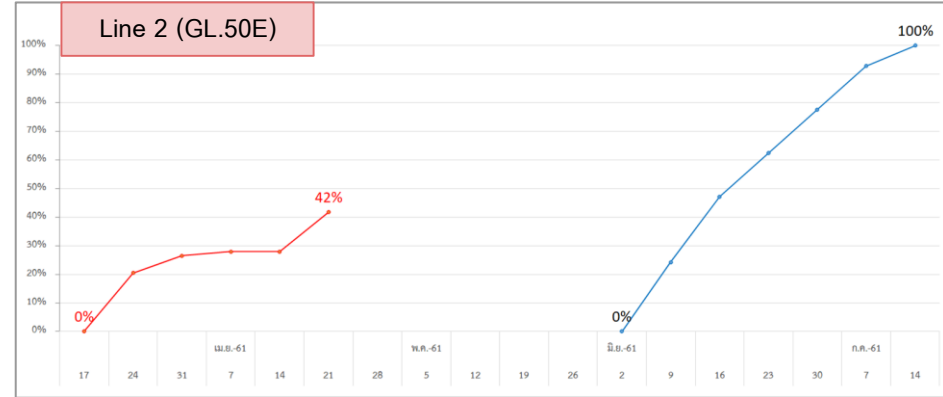

Line 3 (Center)


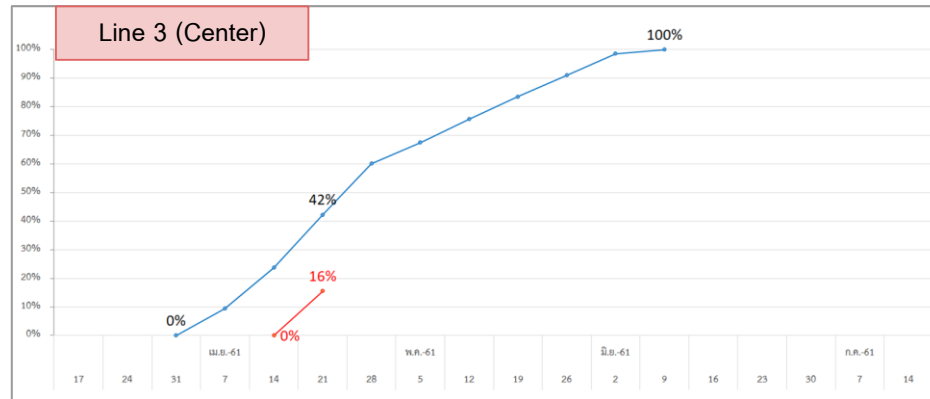


Plan



Actual

ความก้าวหน้างานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102

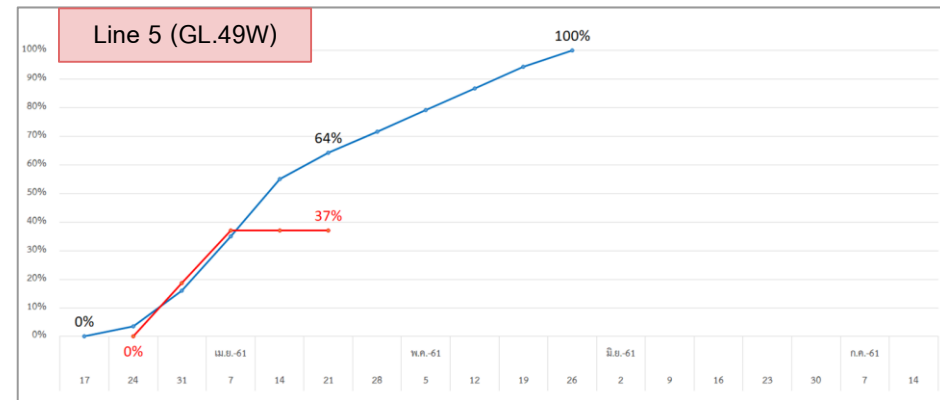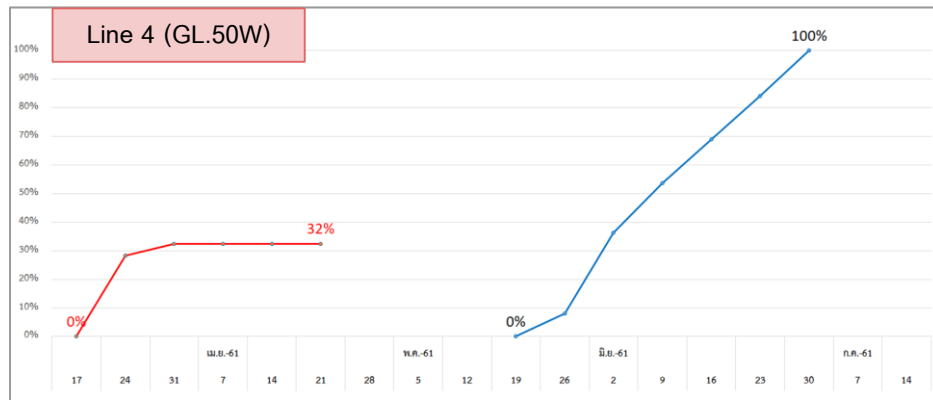

Plan



Actual

ประเด็นสำคัญ

- การสำรวจพื้นที่เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความพร้อม
- การเตรียมการเริ่มงาน Zone 1 (E39-E60) และ Zone 7 (W39-W60)
- แผนงานก่อสร้าง CC1/2
