

ความก้าวหน้าสะสมของงานก่อสร้าง CC3 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561


Data Date : 21 Apr. 2018

	W	Plan	Actual	This 2 weeks	(+/-)
ไฟฟ้า	74.78	86.57%	16.64%	0.01%	-69.93%
ประปา	20.58	97.32%	67.25%	1.18%	-30.07%
น้ำเสีย	4.64	99.88%	44.27%	0.63%	-55.61%
Total	100	89.40%	28.33%	0.27%	-61.07%

หมายเหตุ : ความล่าช้าเพิ่มขึ้น 0.07% จากสัปดาห์ที่แล้ว (ความล่าช้าปัจจุบันประมาณ 47 สัปดาห์เทียบกับแผนงาน)

Overall Progress CC3

Progress Weekly	31 มี.ค. 61	7 เม.ย. 61	14 เม.ย. 61	21 เม.ย. 61	25 เม.ย. 61
Recovery Plan	30.00%	32.53%	34.78%	37.47%	40.08%
Actual	27.61%	28.06%	28.06%	28.33%	
+/- (Ahead/Delay)	-2.38%	-4.47%	-6.72%	-9.14%	
Weekly (Plan)	1.53%	2.53%	2.25%	2.69%	2.61%
Weekly (Actual)	0.63%	0.45%	0.00%	0.28%	

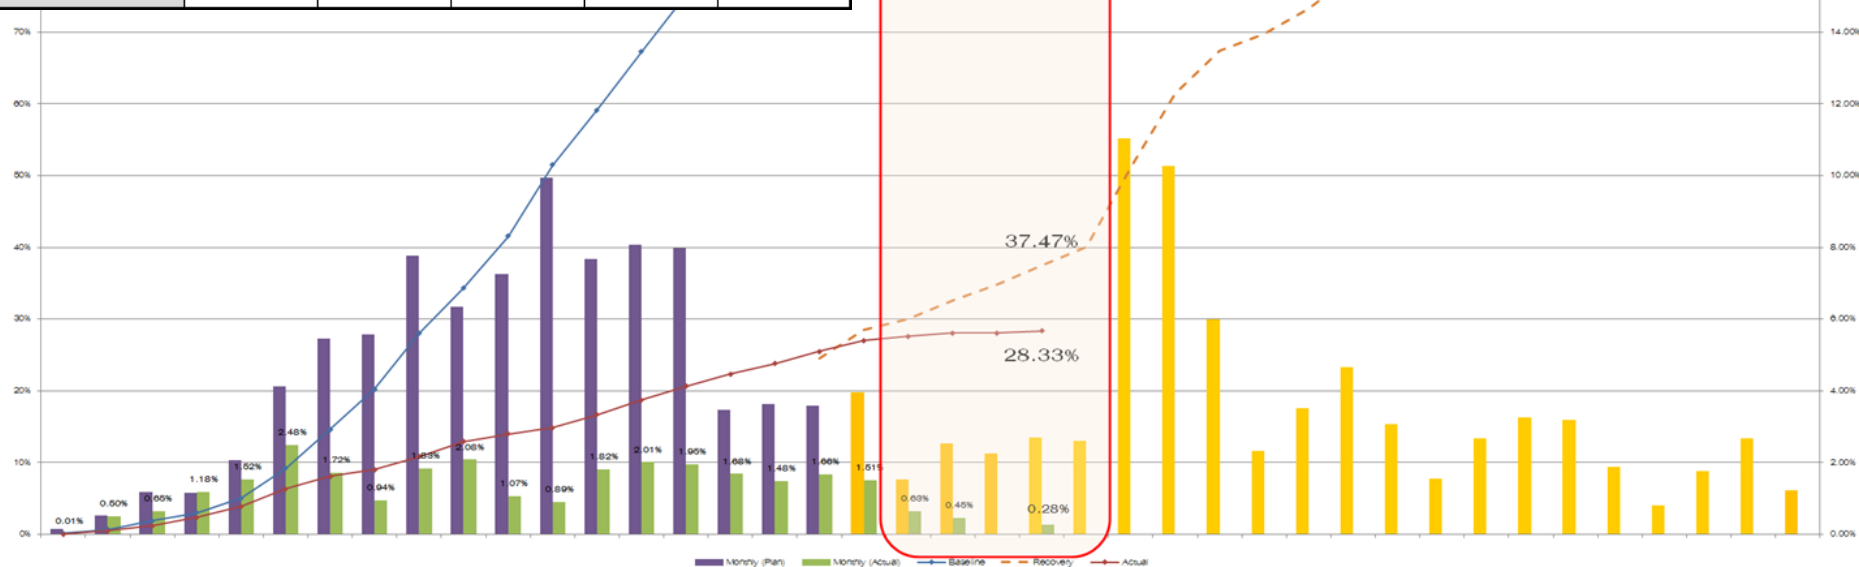

Productivity Rate ของ BASO

Actual

Productivity Rate ของ Recovery


ความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้า

Data Date : 21 Apr. 2018

	W	Plan	Actual	This 2 weeks	(+/-)
ระบบไฟฟ้า 115 kV	20.22	100.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
อาคาร MTS2	16.49	96.49%	19.17%	0.04%	-77.32%
ระบบไฟฟ้า 24 kV	30.26	71.44%	19.04%	0.00%	-52.40%
ระบบ SCADA	7.63	89.19%	43.66%	0.00%	-45.53%

Progress งานระบบไฟฟ้า

Progress Weekly	31 มี.ค. 61	7 เม.ย. 61	14 เม.ย. 61	21 เม.ย. 61	25 เม.ย. 61
Recovery Plan	18.56%	21.05%	23.62%	26.48%	29.30%
Actual	16.60%	16.63%	16.63%	16.64%	
+/- (Ahead/Delay)	-1.96%	-4.42%	-6.99%	-9.84%	
Weekly (Plan)	1.23%	2.49%	2.57%	2.86%	2.82%
Weekly (Actual)	0.07%	0.03%	0.00%	0.01%	

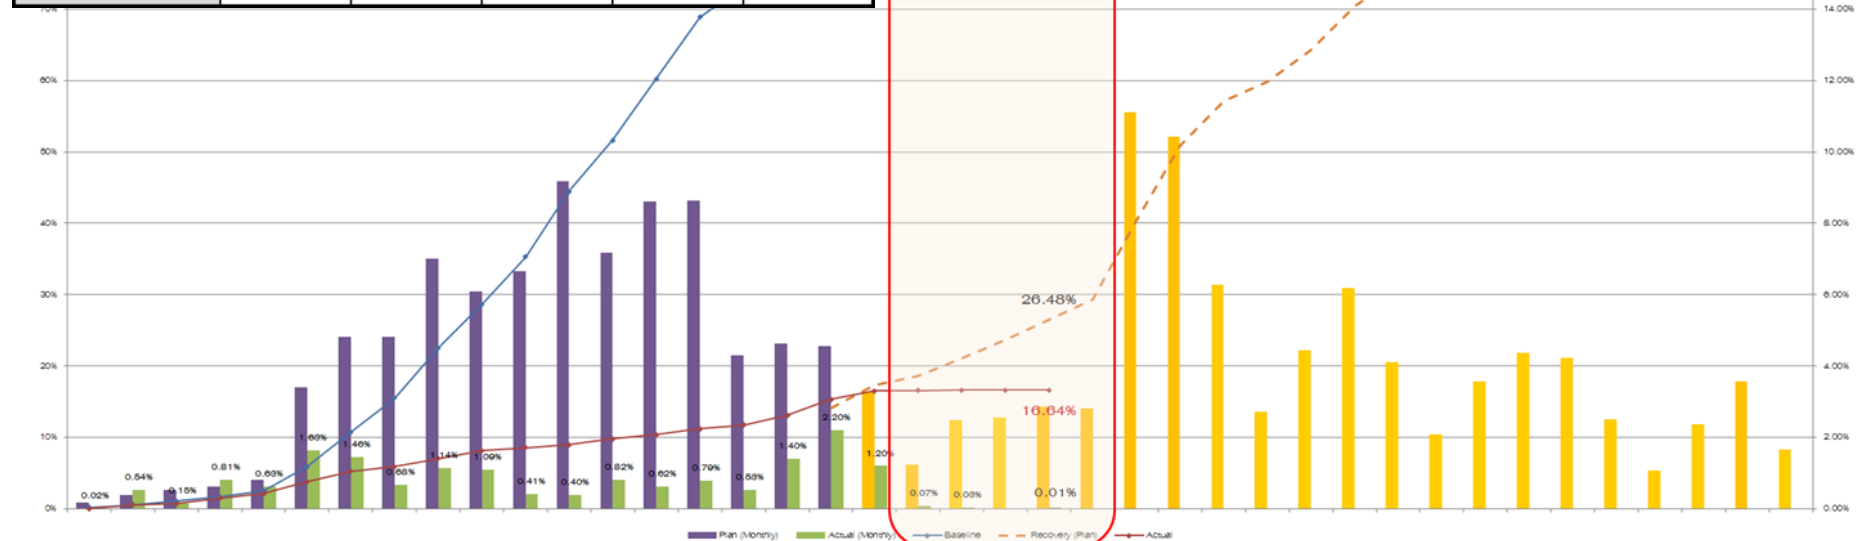

Productivity Rate ของ BAS0

Actual

Productivity Rate ของ Recovery

DB MH 24kV / SCADA



ติดตั้ง DB



ผนังบ่อ MH



ติดตั้งผนัง MH

MTS2



ติดตั้งหม้อแปลง 115 kV อาคาร MTS2


ความก้าวหน้างานระบบประปา

Data Date : 21 Apr. 2018

	W	Plan	Actual	This 2 weeks	(+/-)
ระบบท่อประธาน	2.41	100.00%	82.74%	0.00%	-17.26%
อาคาร WSS2	13.56	95.94%	56.99%	1.78%	-38.95%
ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	4.53	100.00%	89.07%	0.00%	-10.93%

Progress งานระบบประปา

Progress Weekly	31 มี.ค. 61	7 เม.ย. 61	14 เม.ย. 61	21 เม.ย. 61	25 เม.ย. 61
Recovery Plan	68.91%	71.42%	72.30%	73.84%	75.14%
Actual	64.22%	66.07%	66.07%	67.25%	
+/- (Ahead/Delay)	-4.69%	-5.35%	-6.23%	-6.60%	
Weekly (Plan)	2.38%	2.51%	0.88%	1.54%	1.30%
Weekly (Actual)	2.78%	1.85%	0.00%	1.17%	

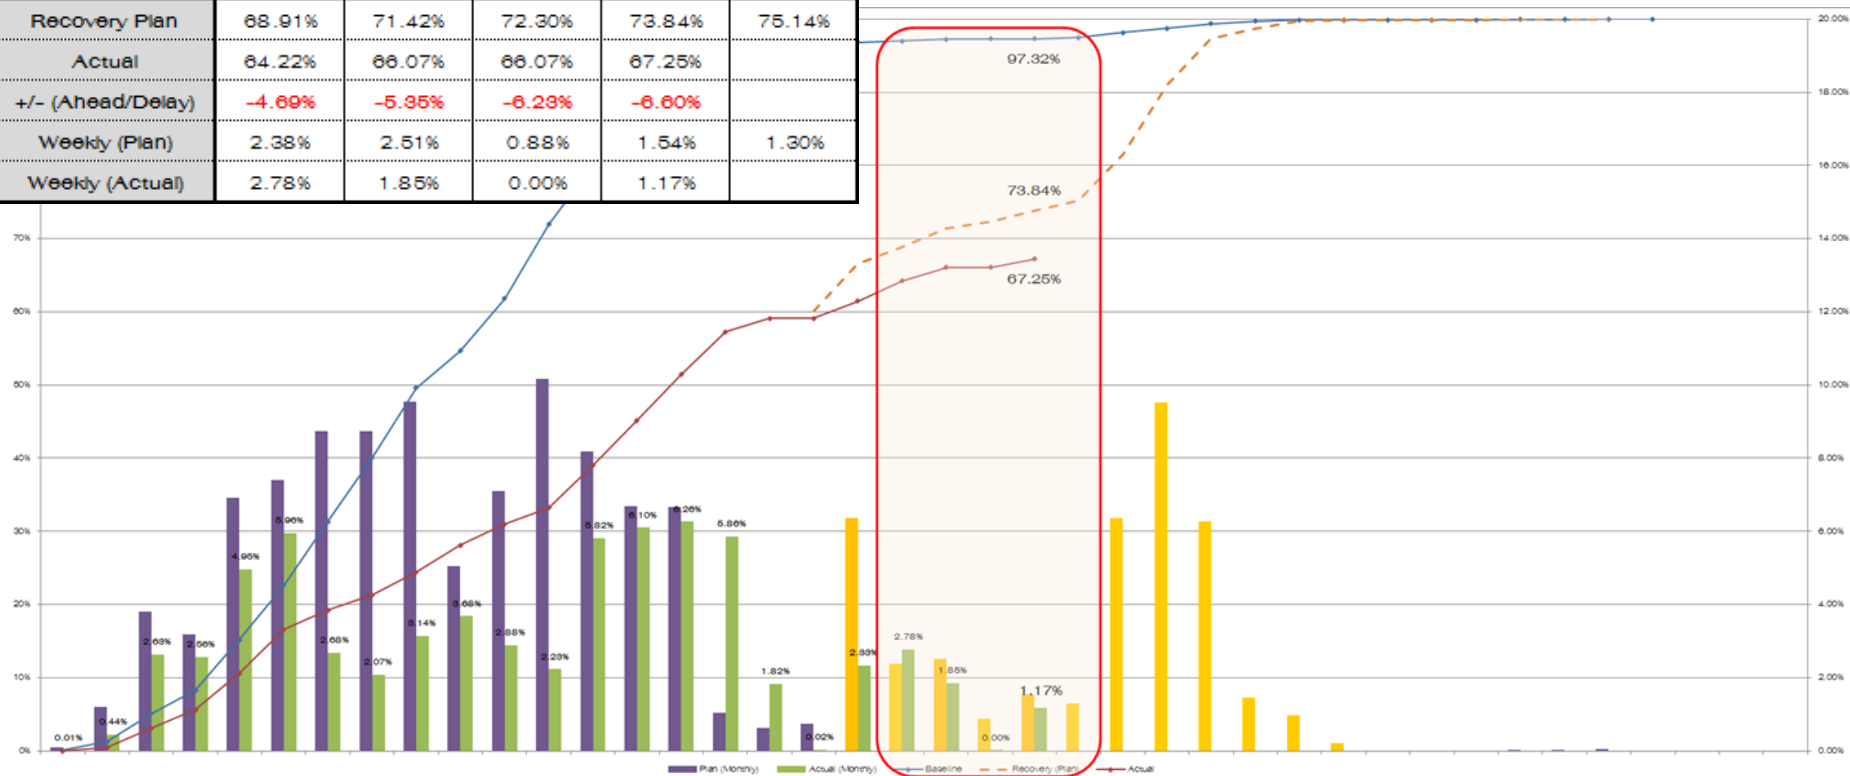

Productivity Rate ของ BAS0

Actual

Productivity Rate ของ Recovery

WSS2



โรงสูบน้ำประปา


ความก้าวหน้างานระบบบำบัดน้ำเสีย

Data Date : 21 Apr. 2018

	W	Plan	Actual	This 2 weeks	(+/-)
ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น	2.35	99.90%	13.60%	1.23%	-86.30%
บ่อบำบัดน้ำเสีย	0.52	99.49%	29.30%	0.00%	-70.19%
ระบบท่อดูดน้ำเสีย	1.76	99.96%	89.59%	0.00%	-10.37%

Progress งานระบบบำบัดน้ำเสีย

Progress Weekly	31 มี.ค. 61	7 เม.ย. 61	14 เม.ย. 61	21 เม.ย. 61	25 เม.ย. 61
Recovery Plan	41.68%	44.99%	48.21%	53.27%	58.33%
Actual	42.85%	43.64%	43.64%	44.27%	
+/- (Ahead/Delay)	1.17%	-1.35%	-4.57%	-9.01%	
Weekly (Plan)	2.58%	3.31%	3.22%	5.06%	5.06%
Weekly (Actual)	0.13%	0.79%	0.00%	0.62%	

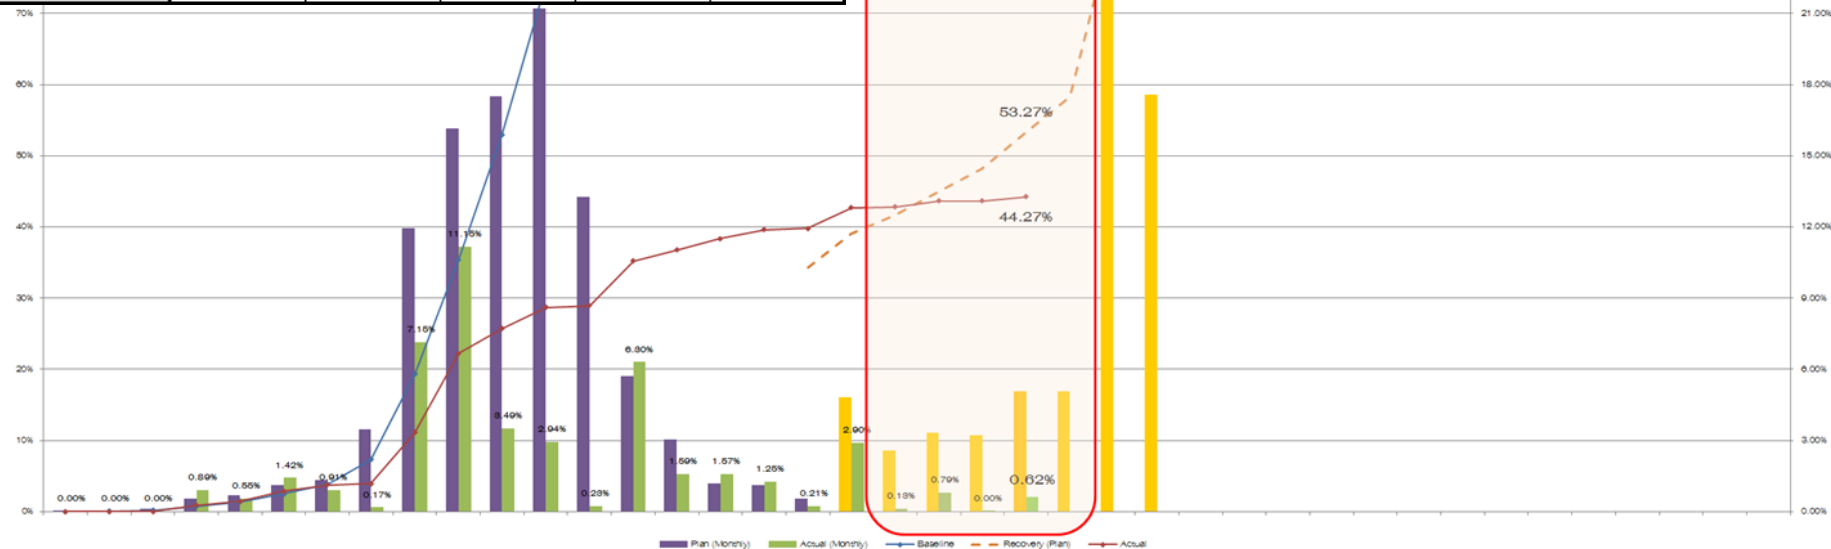

Productivity Rate ของ BAS0

Actual

Productivity Rate ของ Recovery

WWTP



ติดตั้งท่อน้ำเสีย
