


## ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

รายการเอกสารที่ต้องส่ง	กำหนดส่ง ภายใน วันที่	สถานะ	PCS	SCS	AOT
แผนงานก่อสร้าง	7 เม.ย. 61	ตามกำหนด	2 มี.ค. 61	19 พ.ค. 61 Code 3	
แผนผังองค์กร	23 ก.ย. 60	ล่าช้า 83 วัน	8 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างพิจารณา

# ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

Type of Document	Total (Estimate)	Submitted	Approved
Material Submission	500	86	10
Method Statement	100	40	22
Shop Drawing	5000	2046	1006
Total	5600	2063	895

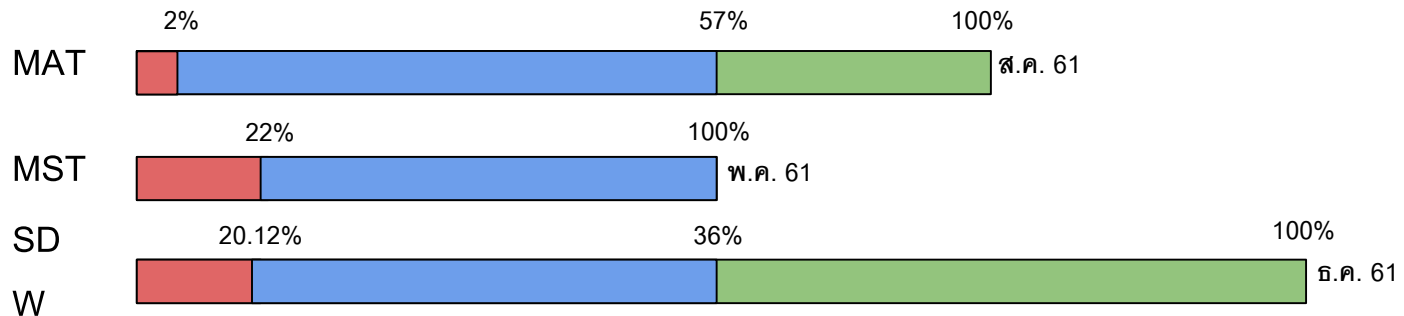

# ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2


Material Stock Yard



งานติดตั้ง Tower Crane (SAT-1)




# แนวกำแพงคอนกรีตบล็อกที่ CC1/2 ดำเนินการ

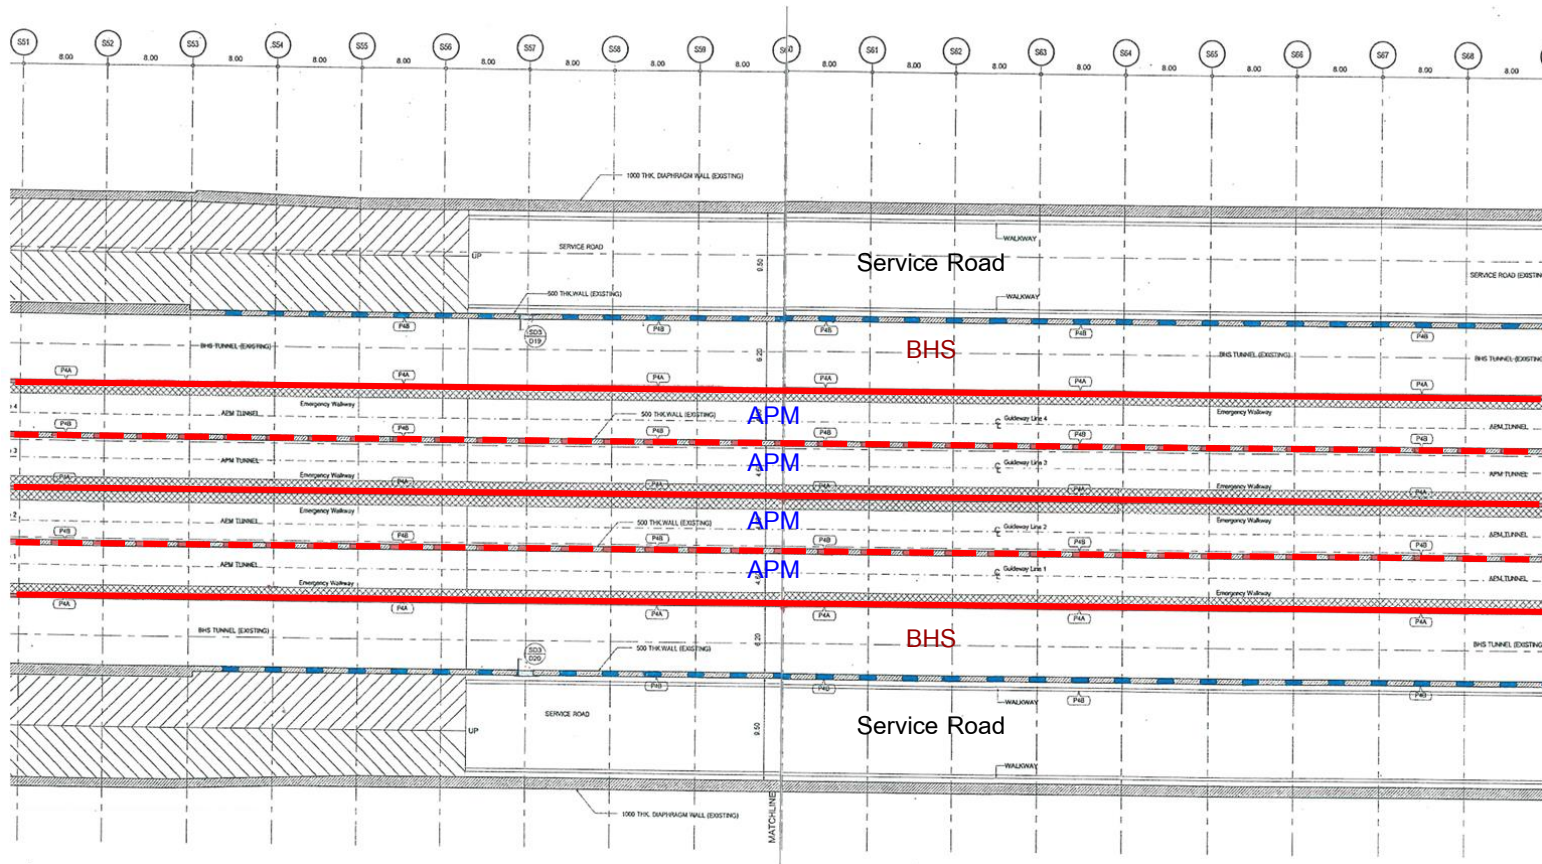

- Line 1 (GL.49E)
- Line 2 (GL.50E)
- Line 3 (Center)
- Line 4 (GL.50W)
- Line 5 (GL.49W)

# ความก้าวหน้ารวมงานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102



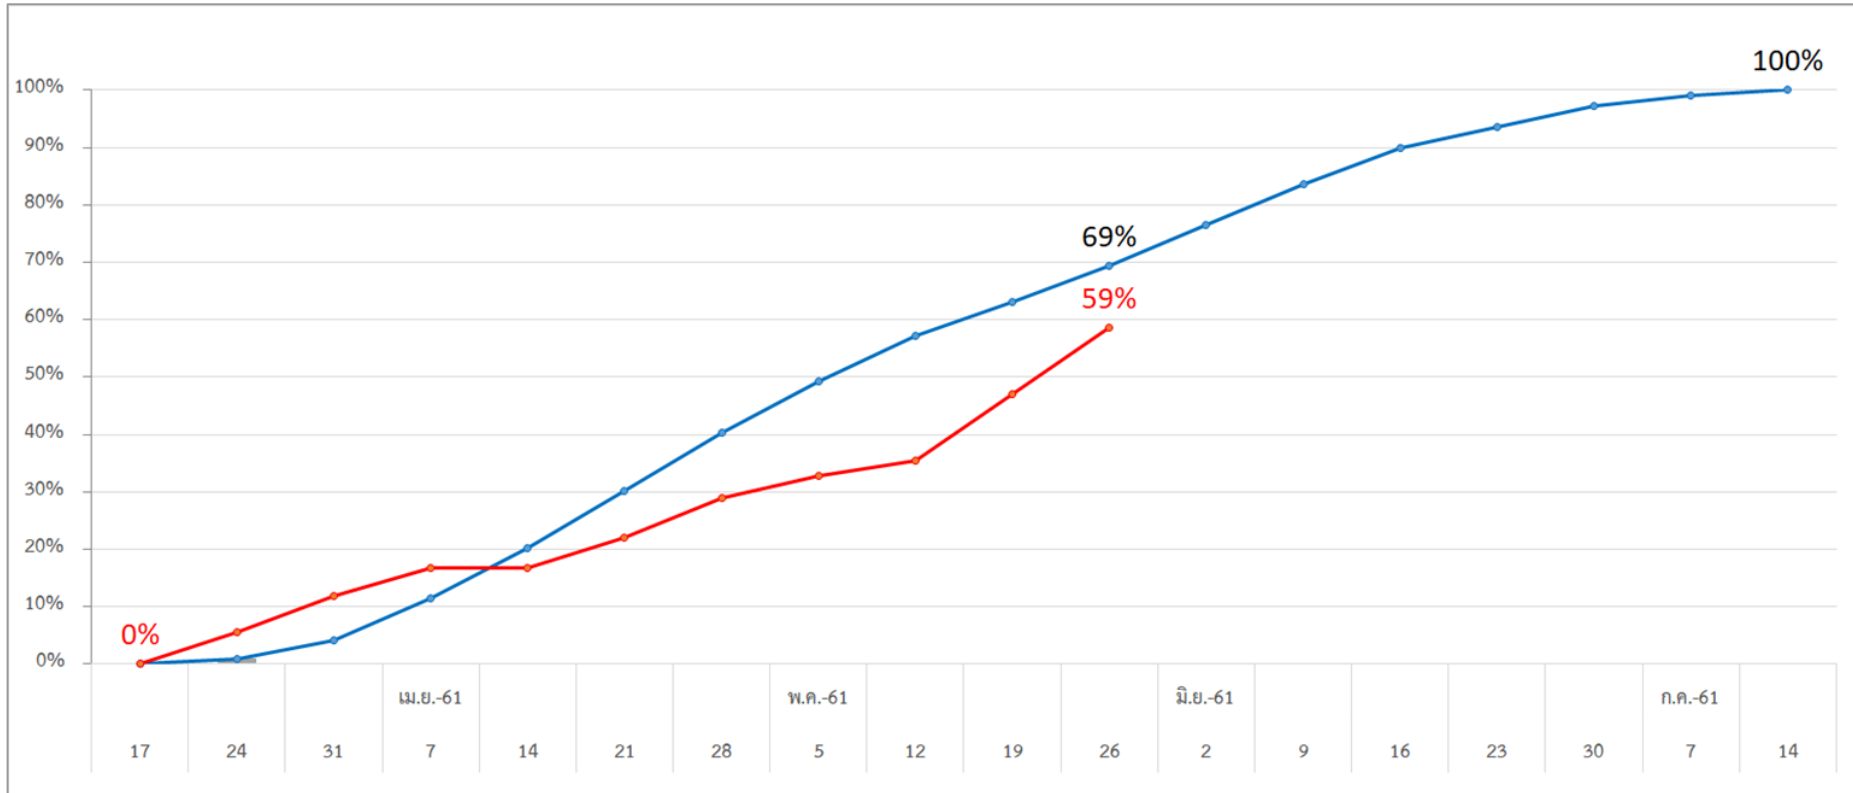


Plan

Actual

Actual

# ความก้าวหน้างานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102

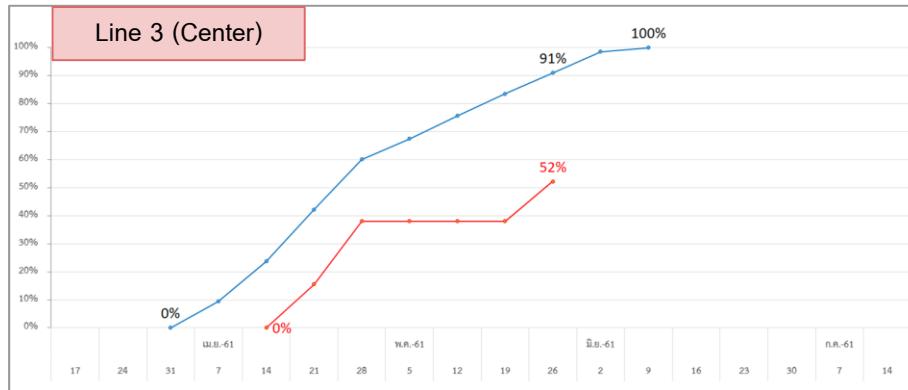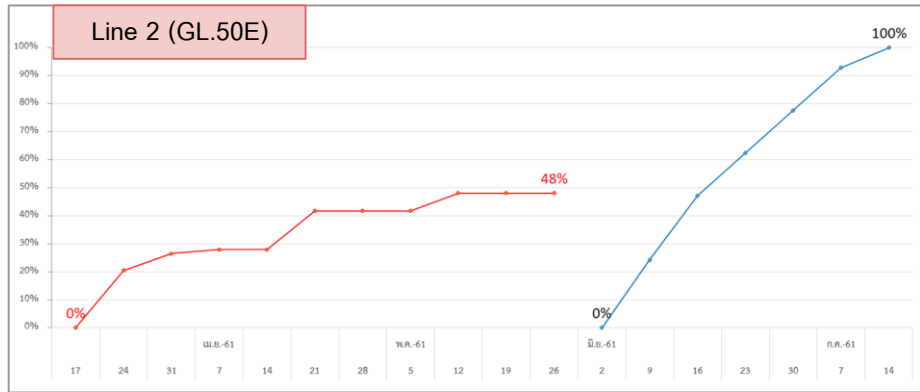
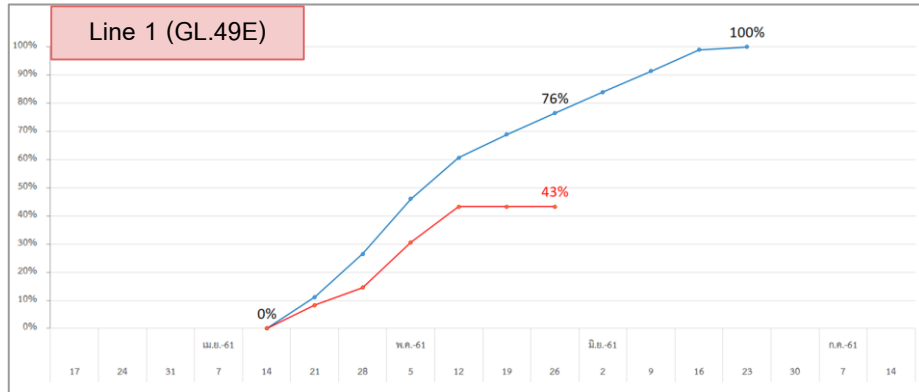


Plan



Actual

# ความก้าวหน้างานกำแพงคอนกรีตบล็อก GL.S24-S102

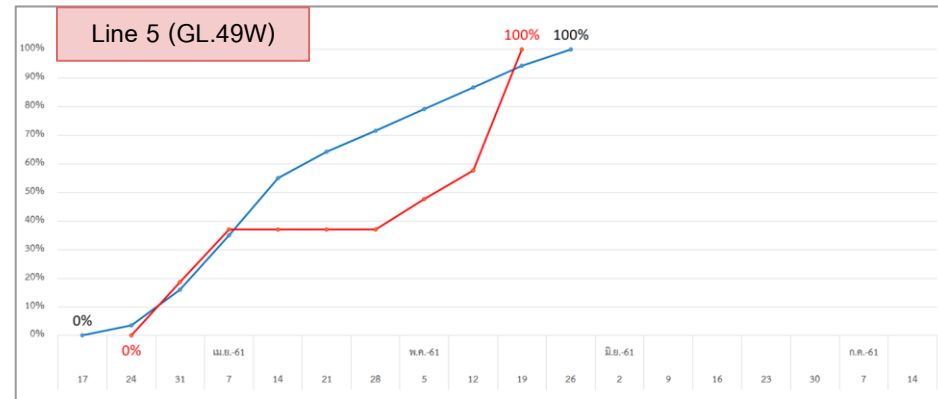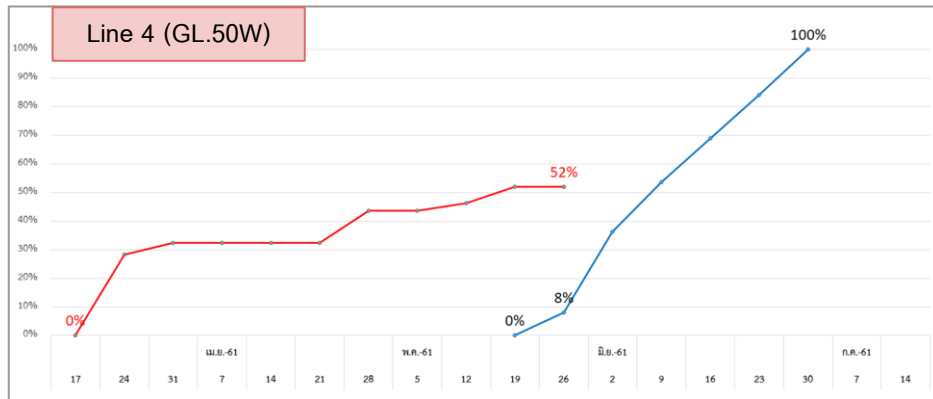


Plan



Actual

# ความคืบหน้าของการดำเนินงาน CC1/2

## งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีตบล็อก

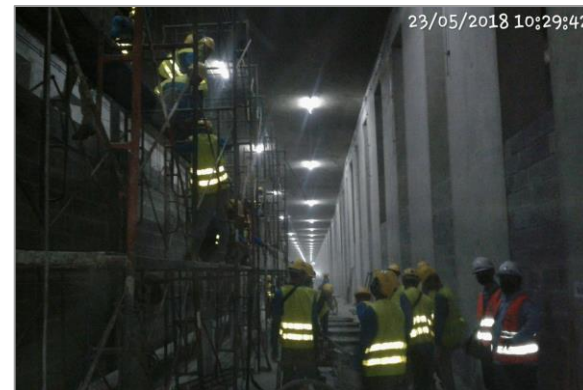



# ความพร้อมในการเข้าพื้นที่ทำงาน CC1/2

ตารางแสดงจำนวนคนที่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

เอกสารที่ต้องนำส่ง	จำนวนทั้งหมด(คน)	นำส่งเอกสารแล้ว (คน)	ยังไม่ได้นำส่ง (คน)
บัตรพนักงาน	475	101	374
ประกันสังคม	475	195	280
เอกสารการอบรมที่อัปเดตอากาศ	221	28	193

ตารางแสดงสถานะเครื่องจักร

ลำดับ	ประเภทเครื่องจักร	สถานะ	เอกสารที่ขาด
1	ปจ.1 No. TC-12 (Yard)	นำส่งเอกสารแล้ว	ขาดเอกสาร 4 ผู้
2	ปจ.1 No.TC-02 (SAT-1)	อยู่ระหว่างการติดตั้ง	-
3	ปจ.1 No.TC-10 (SAT-1)	รอการติดตั้ง	-
4	ปจ.2 FB 1447	ยังไม่มีให้นำส่งเอกสาร	-
