

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

รายการเอกสาร	กำหนดส่ง ภายในวันที่	สถานะ (ถึง 26 พ.ค. 61)	IRTV	SCS	AOT
แผนการดำเนินงาน (Work Schedule BL0)	9 ธ.ค. 60	ล่าช้า 38 วัน	7 พ.ค. 61 (แก้ไขครั้งที่ 2) (อยู่ระหว่างการแก้ไขครั้งที่ 3)	23 พ.ค. 61 (Re.02 แก้ไขและส่งใหม่)	-
ประกันภัยของโครงการ (CAR)	19 ธ.ค. 60	ล่าช้า 94 วัน	23 มี.ค. 61	31 มี.ค. 61 (แก้ไขและส่งใหม่)	AOT สั่งการให้ IRTV ไปจัดทำ CAR ที่ ครอบคลุม Airside ด้วย
แผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan)	19 ธ.ค. 60	ล่าช้า 80 วัน	9 มี.ค. 61 (อยู่ระหว่างการแก้ไขครั้งที่ 1)	19 มี.ค. 61 (แก้ไขและส่งใหม่)	-
แผนความปลอดภัย (Safety Plan)	-	-	3 เม.ย. 61 (แก้ไขครั้งที่ 2) (อยู่ระหว่างการแก้ไขครั้งที่ 3)	16 เม.ย. 61 (แก้ไขและส่งใหม่)	-
แผนงานการส่งเอกสาร (Submittal List)	19 ธ.ค. 60	ล่าช้า 70 วัน	7 พ.ค. 61 (แก้ไขครั้งที่ 1)	อยู่ระหว่างการ พิจารณา	-

รายการเอกสารที่จะต้องส่งก่อนได้รับมอบพื้นที่

รายการเอกสารที่จะต้องส่งก่อน ได้รับมอบพื้นที่	กำหนดส่ง ภายในวันที่	สถานะ (ถึง 26 พ.ค. 61)	IRTV	SCS	AOT
แผนการจัดตั้งสำนักงานและระบบ สุขาภิบาลชั่วคราว	-	-	-	-	-
แผนการประชาสัมพันธ์แบบรูปป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	-	-	-	-	-
แผนการประสานงานสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-

รายการเอกสารที่จะต้องส่งก่อนได้รับมอบพื้นที่

รายการเอกสารที่จะต้องส่งก่อนได้รับมอบพื้นที่	กำหนดส่งภายในวันที่	สถานะ (ถึง 26 พ.ค. 61)	IRTV	SCS	AOT
แผนการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Plan)	-	-	2 เม.ย. 61	27 เม.ย. 61 (ไม่อนุมัติ)	-
แผนการขนส่งวัสดุ	-	-	-	-	-
เสนอชื่อ วิศวกรผู้ตรวจสอบการออกแบบ ค้ายัน นั่งร้าน และโครงสร้างชั่วคราว	-	-	-	-	-

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
1. Guideway	18/1/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV ส่งมาวันที่ 16/05/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง
2. Vehicle	19/3/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV ส่งมาวันที่ 15/05/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง
3. Depot Equipment	18/4/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV ส่งมาวันที่ 21/05/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง


ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
4. Power Distribution System (PDS)	18/4/61	0% IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561 (SCS อยู่ระหว่างการออก Certificate)	0% (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) (SCS อยู่ระหว่างการออก Certificate)	IRTV ส่งแล้ว IRTV นำส่ง 18/04/2561
KD01- Completed design for PDS including All requirements of Housekeeping, UPS and Traction Substation System	18/4/61	0% IRTV ส่งมาวันที่ 24/05/2561 (SCS อยู่ระหว่างการออก Certificate)	0% (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) (SCS อยู่ระหว่างการออก Certificate)	IRTV ส่งแล้ว IRTV นำส่ง 18/04/2561
5. Station Equipment (PSD)	18/4/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV ส่งมาวันที่ 18/04/61	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

เอกสารที่ต้องส่งตามสัญญา ของ Milestone	MS Date	PER (30% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	IER (65% progress เมื่อได้รับ Code 1 or 2)	FER (100% progress เมื่อได้รับ Code 1)
6. Communications (COM)	18/5/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV นำส่ง 17/05/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง
7. Operation Control Center (OCC) System	18/5/61	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง
8. Automatic Train Control (ATC)	17/6/61	0% (ขาด Compliance Matrix) IRTV นำส่ง 15/05/2561	ยังไม่ได้ส่ง	ยังไม่ได้ส่ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน CC4 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

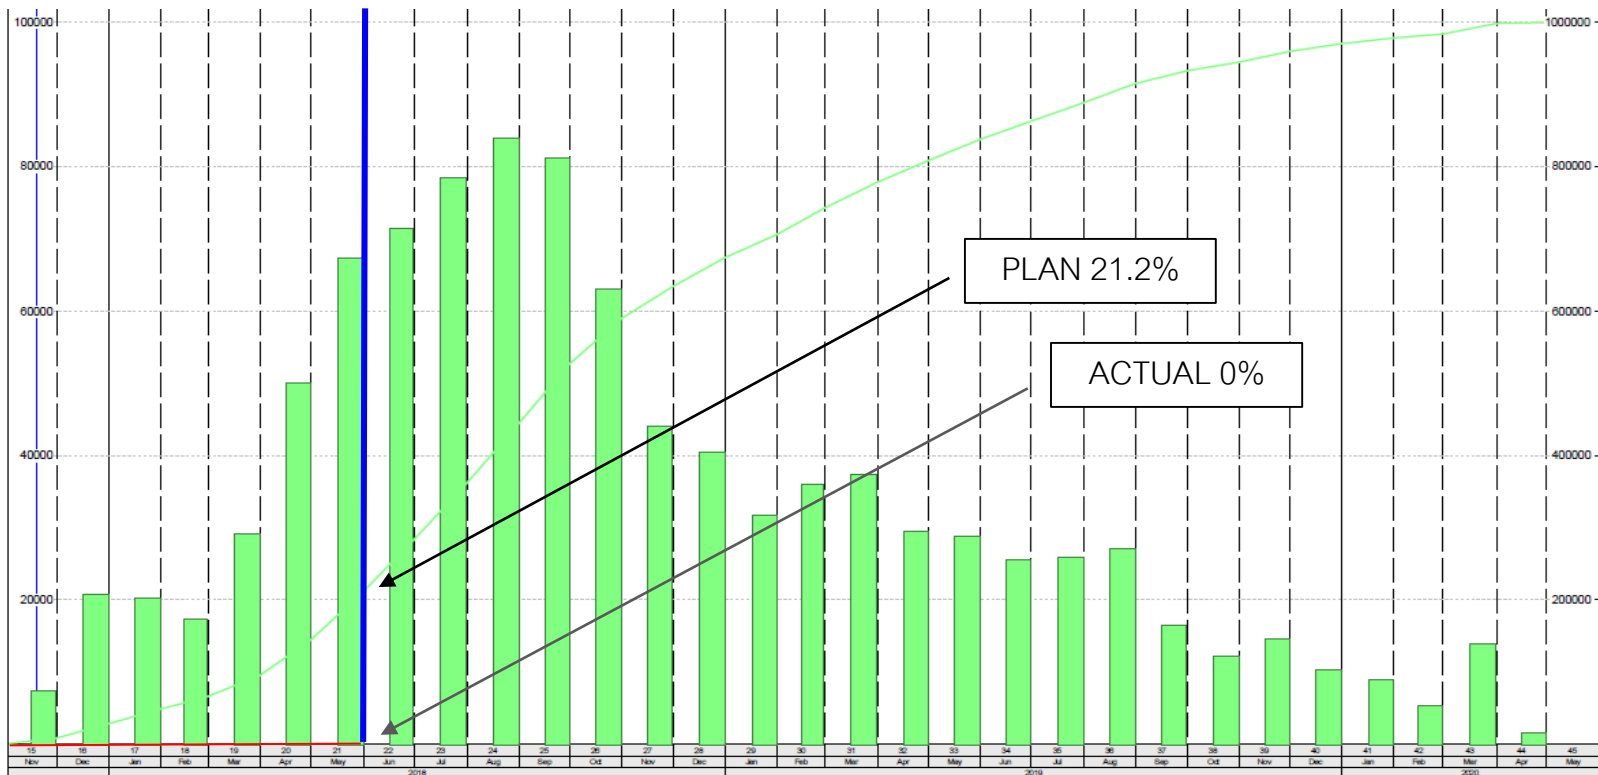

PLAN อ้างอิงจากแผนงานก่อสร้าง/ติดตั้งที่ CC4 ส่งมาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ซึ่ง CSC พิจารณาให้

Code 3
