

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561


Package	Plan (ส.ค.-60)	Actual (ส.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	39.90%	25.71%	-14.19%

Quality Assurance / Quality Control

ทดสอบแท่นตัวอย่างคอนกรีต สัญญา CC1.1



งานทดสอบแท่นตัวอย่าง PQC สัญญา CC1.1

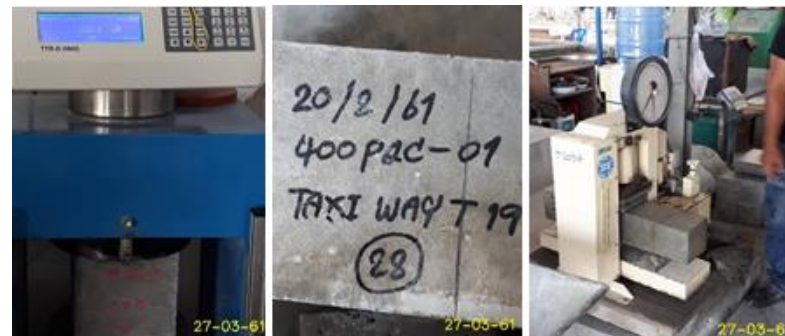

ทดสอบ CTB สัญญา CC1.1



ตัดเหล็กตัวอย่างไปทดสอบของ Set-1 สัญญา CC1.1



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภ้ยๆ ของ CC1/1

Morning Talk



ตรวจเช็คควาล์วกันย้อน



ตรวจ PPE



ตรวจสอบอุปกรณ์การยก



ลงชื่อเข้าทำงานที่อับอากาศ

ตรวจเช็คถังดับเพลิง

ติดป้ายความปลอดภัย
เพิ่มเติม

กิจกรรม 5 ส

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1



ก่อนแก้ไข ให้ตรวจสอบนั่งร้าน และติด Tag ให้เห็นอย่างชัดเจน



หลังแก้ไข จัดทำการตรวจสอบนั่งร้าน และติด Tag ให้เห็นอย่างชัดเจน



ก่อนแก้ไข ให้จัดทำราวกันตก และป้ายเตือน



หลังแก้ไข จัดทำราวกันตก และป้ายเตือน

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

Morning Talk



อบรมพนักงานใหม่



ตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้า



กิจกรรม 5 ส



ตรวจเช็คตู้ไฟฟ้า



การกั้นพื้นที่ต่างระดับ



แสงสว่างในการทำงาน



ป้ายเตือนความปลอดภัย

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3



ก่อนแก้ไข ให้งั้นพื้นที่ต่างระดับ



หลังแก้ไข จัดทำการกันพื้นที่ต่างระดับ




ก่อนแก้ไข ให้จัดทำราวกันตก



หลังแก้ไข จัดทำราวกันตกและติดป้ายเตือน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลตรวจวัดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน ในช่วงวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD และโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

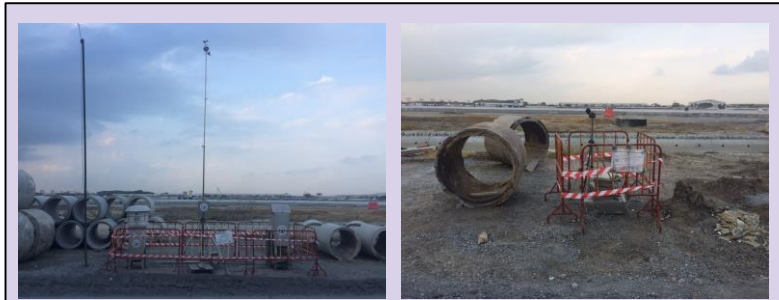

จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD



จุดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
