

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

Package	Plan (ส.ค.-60)	Actual (ส.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	36.66%	27.36%	-9.30%

Quality Assurance / Quality Control

ทดสอบแท่นตัวอย่าง PQC สัญญา CC1.1



ตรวจเช็คความหนาแอสฟัลท์ติก สัญญา CC1.1



Audit ที่ทีมงาน Sat-1 สัญญา CC1.1



ตัดเหล็กตัวอย่างก่อนใช้งานไปทดสอบ สัญญา CC1.2



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัย ของ CC1/1

Morning Talk




จัดทำราวกันตกเพิ่มเติม



กิจกรรม 5 ส



ติดป้ายกฎระเบียบการทำงานที่อับอากาศ

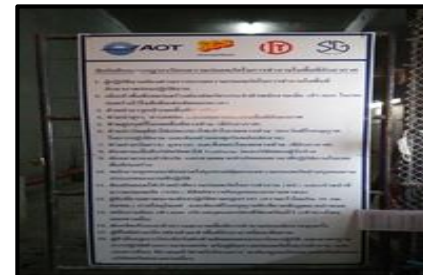

อบรมการทำงานในที่อับอากาศ



ป้องกันสายไฟฟ้าแช่น้ำ



ตรวจเช็คตู้ไฟฟ้า



ตรวจเช็คถังลมถังแก๊ส

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1



ก่อนแก้ไข ให้จัดทำราวกันตก



หลังแก้ไข จัดทำราวกันตก



ก่อนแก้ไข ให้มีแผ่นรองขาเครน



หลังแก้ไข จัดให้มีแผ่นรองขาเครน

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

Morning Talk



อบรมพนักงานใหม่



ประชุม คปอ.



แสงสว่างในการทำงาน



กิจกรรม 5 ส



กันพื้นที่ต่างระดับ



เพิ่มเติมป้ายความปลอดภัย



ตรวจเช็คตู้ไฟฟ้า



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3 ยังไม่มีการแก้ไข



ก่อนแก้ไข ให้จัดเก็บสายไฟฟ้าให้ปลอดภัยในเส้นทาง

จรรยา



ก่อนแก้ไข จัดเก็บสายไฟฟ้าให้ปลอดภัยในเส้นทาง

จรรยา



ก่อนแก้ไข ให้จัดทำราวกันตก



ก่อนแก้ไข จัดทำราวกันตก

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัย ของ CC1/2

Morning Talk



ห้องอบรม



ห้องพยาบาล



ตรวจเช็คอุปกรณ์การยก



ตรวจสอบนั่งร้าน



ตรวจวัดสภาพอากาศ



ตรวจเช็ครถยก



กิจกรรม 5 ส



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/2 ยังไม่มีการ
แก้ไข



ก่อนแก้ไข ให้จัดทำราวกันทาวเวอร์เครน



ก่อนแก้ไข ให้ตรวจสอบไฟแสงสว่าง



ก่อนแก้ไข ให้จัดป้ายเตือนระวังทางเข้า-
ออก



ก่อนแก้ไข ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจราจรให้
ปลอดภัย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลตรวจวัดฝุ่นละออง และเสียง ในช่วงวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD และโรงเรียนวัดกิ่งแก้วส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



จุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ITD



จุดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
