

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561

Package	Plan	Actual	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	46.31%	30.29%	-16.02%

Quality Assurance / Quality Control

สัญญา CC1/1

ตรวจเช็คงานลาดยางแอสฟัลท์ติกในอุโมงค์



ตัดตัวอย่างเหล็กไปทดสอบ



สัญญา CC1/2

ตรวจสอบ Steel Plate ที่โรงงาน MCS ก่อนวัสดุเข้าหน้างาน



ตรวจสอบท่อเหล็กดำแบบตะเข็บ



การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1

Morning Talk



ตรวจพนักงานก่อนเข้าอุโมงค์




ประชุมความปลอดภัย



ตรวจแนวรั้ว



Check list การตรวจ
เครื่องจักร

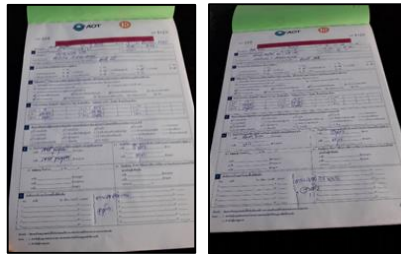

ตัวอย่าง Work Permit



ตรวจตู้ไฟฟ้า



กิจกรรม 5 ส.

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/1



ก่อนแก้ไข แสงสว่างในพื้นที่ไม่เพียงพอ



หลังแก้ไข ติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม



ก่อนแก้ไข ติดตั้งสายไฟให้เหนือพื้นดิน ป้องกันการโดนน้ำ



หลังแก้ไข ติดตั้งสายไฟเหนือพื้นดิน

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC3

Morning Talk



ประชุมความปลอดภัยฯ



การทำงานในพื้นที่อัป
อากาศ



ตรวจวัดอากาศ



การตรวจอุปกรณ์/
เครื่องมือ



กั้นพื้นที่ต่างระดับ



เพิ่มเติมป้ายเตือน/ป้าย
บังคับ



กิจกรรม 5 ส.

การจัดการด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/2

Morning Talk



อบรมพนักงานใหม่



ประชุมความปลอดภัยฯ

Mobile Crane & Hoist Truck Daily Check List	
1. ตรวจสอบเอกสาร	<input type="checkbox"/>
2. ตรวจสอบสภาพรถ	<input type="checkbox"/>
3. ตรวจสอบน้ำมัน	<input type="checkbox"/>
4. ตรวจสอบลมยาง	<input type="checkbox"/>
5. ตรวจสอบไฟ	<input type="checkbox"/>
6. ตรวจสอบเบรค	<input type="checkbox"/>
7. ตรวจสอบสายพาน	<input type="checkbox"/>
8. ตรวจสอบน้ำหนัก	<input type="checkbox"/>
9. ตรวจสอบอุปกรณ์	<input type="checkbox"/>
10. ตรวจสอบความปลอดภัย	<input type="checkbox"/>
11. ตรวจสอบการสื่อสาร	<input type="checkbox"/>
12. ตรวจสอบการยก	<input type="checkbox"/>
13. ตรวจสอบการจอด	<input type="checkbox"/>
14. ตรวจสอบการเคลื่อนที่	<input type="checkbox"/>
15. ตรวจสอบการปิดเครื่อง	<input type="checkbox"/>
16. ตรวจสอบการเปิดเครื่อง	<input type="checkbox"/>
17. ตรวจสอบการบำรุงรักษา	<input type="checkbox"/>
18. ตรวจสอบการทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
19. ตรวจสอบการแจ้งเตือน	<input type="checkbox"/>
20. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	<input type="checkbox"/>

ตรวจความปลอดภัยพื้นที่หน้างาน



กิจกรรม 5ส.

ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์

Check list การตรวจเครื่องจักร

ตรวจเช็คตู้ไฟฟ้า

การจัดการด้านความปลอดภัย


ภาพกิจกรรมความปลอดภัยฯ ของ CC1/2



ก่อนแก้ไข ต้องจัดให้มีไลท์ไลน์คล้องเกี่ยวให้ปลอดภัย



หลังแก้ไข จัดทำไลท์ไลน์คล้องเกี่ยวให้ปลอดภัย

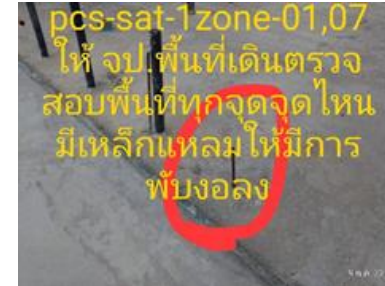

ก่อนแก้ไข ต้องพับเหล็กแหลม เพื่อป้องกันการ สะดุด



หลังแก้ไข พับเหล็กเรียบร้อย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ และระดับเสียง

- CC1/1 (ITD) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างทั่วไป โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 คุณภาพอากาศ และระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้าง ITD และบริเวณโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- CC1/2 (PCS) จะมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างทั่วไปโดยจะมีการตรวจวัดครั้งต่อไปในเดือน พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างรอการตรวจวัด
- CC3 (SGI) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 วัน ต่อเนื่องทุก 3 เดือน ในช่วงการก่อสร้างทั่วไป โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 คุณภาพอากาศ และระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้าง SGI และบริเวณโรงเรียนทวะคลองตรง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม CC1/1

ฉีดพรมน้ำในพื้นที่
ก่อสร้าง



การเก็บขยะในรางระบาย
น้ำ



การทำความสะอาดถนน



สูบล้างปฏิภาณบริเวณหน้างาน

17 ส.ค. 2018 9:12:51 ก่อนเที่ยง



การเก็บขยะในพนัง
ก่อสร้าง



การทำความสะอาด
อุโมงค์

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อม CC1/2

การทำความสะอาดถนนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



การเก็บขยะในพื้นที่ก่อสร้าง



ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง



การเก็บขยะในทางระบายน้ำ



ขุดลอกทางระบายน้ำ



กำจัดวัชพืชในทางระบายน้ำ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

